

**Apoyo a la reapertura de los servicios en el Saint  
Joseph´s Catholic Hospital de Monrovia  
(Liberia), tras la epidemia de ébola.**



**INFORME FINAL**

# ÍNDICE DOCUMENTACIÓN

## INFORME TÉCNICO

- Informe final
- Reportes de la empresa constructora

## INFORME ECONÓMICO:

- Ingreso del primer 40% de la subvención
- Ingreso del segundo 60% de la subvención
- Transferencia del primer 40% de la subvención al SJCH
- Transferencia del segundo 60% de la subvención al SJCH
- Recepción del primer 40% de la subvención en el SJCH
- Recepción del segundo 60% de la subvención en el SJCH
- Facturas justificativas del proyecto

## ANEXOS:

- Fotografías del proceso de construcción

## **INFORME TÉCNICO**

- Informe final
- Reportes de la empresa constructora

- Informe final



# Apoyo a la reapertura de los servicios en el Saint Joseph's Catholic Hospital de Monrovia tras la epidemia de ébola.

## DATOS GENERALES

País: Liberia

Zona de actuación: Monrovia

Situación de POST EMERGENCIA: epidemia de ébola en África del Oeste

Período de intervención: 01/10/2015 a 01/10/2016

Población beneficiaria: población de la capital, Monrovia

Contraparte: St. Joseph's Catholic Hospital, Monrovia

Coste total: 55.250 euros

Cantidad solicitada: 49.700 euros



## LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

- Liberia:
  - Saint Joseph's Catholic Hospital, situado en la capital del País, Monrovia. Distrito de Congo Town.

## Valoración global

Podemos calificar la valoración del proyecto como positiva, pues se ha contribuido de manera óptima a los objetivos según los resultados planteados. Mediante este proyecto se ha reestructurado un edificio antiguo para consultas externas y se ha creado una oficina de clasificación y archivo de documentos, un espacio de almacenamiento de registro, así como una sala de conferencias para educación sanitaria de pacientes con SIDA y tuberculosis.

El St. Joseph's Catholic Hospital se ha hallado inmerso en un proceso de reapertura, desde que la OMS declaró a Liberia, a finales de marzo de 2016, como libre de emergencia internacional. Este proceso de reapertura ha requerido varios meses de preparación para el personal local y el apoyo de diversas instituciones que, con sus aportaciones económicas, han contribuido al funcionamiento del hospital en este contexto de emergencia, primeramente, y post emergencia en la actualidad.

La situación de crisis que atravesó el país, con el sistema sanitario colapsado y una sensación permanente de miedo por parte de los pacientes, exigió que la atención realizada en las primeras fases de apertura del hospital fuese gratuita, lo que dificultó aún más el sostenimiento económico del centro.

La subvención concedida por el *Fondo de Solidaridad Zer0,7% de los trabajadores del Gobierno Vasco y Osakidetza*, en la convocatoria de 2015, fue de un total de 49.700 euros, estructurados en 47.500 euros para la misma construcción y 2.200 euros en costes indirectos. No obstante, para completar el coste total del proyecto, valorizado en 55.250 euros, la contraparte local aportó un monto de 5.550 euros, 2.500 euros para hacer frente al total del coste de construcción y 3.050 euros en personal local.

En cuanto al avance de las actividades planteadas en la formulación del proyecto, se han valorado positivamente, tanto en los trabajos de reforma, adecuación y ampliación de la sala de historias clínicas en el edificio antiguo como las obras de construcción.

Para la ejecución de las obras, el *Saint Joseph's Catholic Hospital* contó con la empresa *Trinity Technical Services INC*, una entidad con la que no se había trabajado hasta el momento, pero de la que se tenían buenas referencias. Dado el ritmo y la calidad de los trabajos, se ha considerado que la elección fue acertada.

Como se nombró en el informe de seguimiento, el primer 40 % de la subvención concedida por el Fondo de *Solidaridad Zer0,7%* (19.880 euros) a la Asociación Africanista Manuel Iradier (AAMI) y la Fundación Signos Solidarios (FSS), que se tradujo en 21.117,45 USD en la cuenta bancaria local, se ha invertido de manera íntegra en las tres primeras fases del proceso de construcción:

- Limpieza del terreno y excavaciones
- Cimentación
- Elevación de muros

En paralelo, el *Saint Joseph's Catholic Hospital* siguió atendiendo a la población de la zona y trabajando para abrir paulatinamente todas sus áreas de actividad.

El 29 de Junio de 2016, se realizó la segunda transferencia, el restante 60% de la subvención, con un monto de 27.620 €. El *St. Joseph's Catholic Hospital* recibió un total de 30.022,90 USD. Por tanto, la suma de ambas transferencias enviadas a la contraparte local, 27.620 y 19.880 euros, asciende a la cantidad presupuestada de 47.500 euros para la ejecución de los costes directos de este proyecto.

La segunda transferencia realizada completó la subvención concedida por el *Fondo de Solidaridad Zer0,7%*, y se puede señalar que se ha invertido en el trabajo de la estructura que consiste en:

- Conclusión del trabajo de techo
- Enyesado
- Cableado eléctrico
- Fontanería

Como puede observarse en las imágenes, el edificio que albergará la sala de archivos no está terminado aún. Actualmente se está finalizando con el embaldosado, que tuvo que retrasarse por restricciones en la fábrica. La entrega definitiva del edificio se realizará el próximo 30 de noviembre por lo que, en esa fecha, se facilitarán fotografías con el aspecto definitivo del edificio.

### **Objetivos y resultados**

La dirección del *Saint Joseph's Catholic Hospital* planteó como necesidad prioritaria la mejora en la gestión del historial clínico, con el fin de contribuir a rehabilitar el centro tras la epidemia de Ébola.

Debido al espacio limitado de esta sala, que hacía las funciones de área de registros, los expedientes de los pacientes se quedaban en el suelo a la espera de ser archivados cuando fuera posible. Esta situación derivaba, además de, en una mala presentación e imagen, en un estado constante de desorganización, dadas las dificultades para recuperar los archivos en caso de necesidad de revisión.

A esto se añade el hecho de que la anterior ubicación de la actual sala de archivos afectaba a la circulación de pacientes en el Hospital, congestionando los espacios cercanos y creando situaciones de inseguridad. Ya que, además, en periodo post Ébola deben evitarse las aglomeraciones.

Los resultados planteados para este proyecto han sido:

- Reestructurar un edificio antiguo que se encuentra fuera de las salas de consulta, pero al alcance de las consulta externas.
- Creación de una oficina de clasificación y archivo de documentos, además de una sala de conferencias para educación sanitaria de pacientes con SIDA y tuberculosis, así como un espacio de almacenamiento para otro tipo de libros de registro.

La creación de este espacio es primordial para el funcionamiento adecuado del hospital, y para favorecer y posibilitar la apertura y desarrollo de las distintas áreas del mismo.

El *Fondo de Solidaridad Zer0,7%* hizo efectivo el pago del primer 40% de los fondos con fecha de 17/12/2016, cantidad que fue ingresada en la cuenta de la Fundación Signos Solidarios el día 19/01/2016. El día 27/01/2016 éstos fueron transferidos al *Saint Joseph's Catholic Hospital* de Monrovia (se adjuntan comprobantes de envío de transferencia, que fue recibida en la cuenta local el 28-01-2016). La cantidad neta recibida por parte del Hospital fue de 21.117,45 dólares.

El segundo pago, con el restante 60%, menos los costes indirectos, se realizó de Asociación Africanista Manuel Iradier con un monto de 28.500 euros percibidos del

*Fondo Solidaridad Zer0,7*, los cuales fueron enviados a la Fundación Signos Solidarios el día 28 de Junio de 2016. Este mismo monto, menos la parte correspondiente a los costes indirectos de la Fundación Signos Solidarios, es decir, 27.620 euros, se envió al *St. Joseph's Catholic Hospital* que recibió 30.022,90 dólares el día 22 de Julio de 2016, según el justificante de *Internacional Bank (Liberia) Limited* consultado. (También se adjuntan comprobantes de envío y recepción de las transferencias comentadas).

Por tanto, teniendo en cuenta las actividades previstas, su ejecución y los resultados, se puede señalar que, ha sido positivo el modo en el que se ha desarrollado el proyecto, así como la relación existente entre los objetivos esperados y los resultados obtenidos.

### **Sobre actividades**

El proyecto, como bien se nombró en el informe de seguimiento, se inició oficialmente el 6 de marzo de 2016, después de que la empresa constructora terminara los trabajos de limpieza del terreno.

Esta labor implicó el traslado de dos tanques de gasóleo que se encontraban enterrados en el suelo y que tuvieron que ser reubicados en otra área, actualmente empleada como gasolinera.

Además de esto, y de forma previa al inicio de las obras, se procedió a la demolición del edificio existente, que se encontraba en ruinas.

Una vez finalizados estos trabajos, se comenzó con la fase de cimentación. Basándose en la geología del lugar, se instaló una cama de malla de 7 pies de profundidad. Se excavaron las zanjas para la fosa séptica y se delimitaron los extremos del terreno para evitar corrimientos y desprendimientos de tierra.

En una fase posterior, se comenzaron a ejecutar las tareas de elevación de muros, con bloques de hormigón. Se instalaron las vigas y se adquirieron los materiales necesarios para la siguiente fase, que comprende la instalación del tejado y los acabados interiores, electricidad y fontanería.

Una vez obtenidos los materiales necesarios se ejecutaron las actividades relacionadas con la instalación del tejado, los acabados interiores con el enyesado, la instalación eléctrica del edificio, así como la fontanería. Estas actividades, según el informe de la empresa ejecutora *Trinity Technical Services*, finalizaron el 30 de octubre de 2016. Suponiendo, por tanto, la finalización de las actividades financiadas por el *Fondo de Solidaridad Zer0,%..*

### **Sobre contraparte y contexto**

El *Saint Joseph's Catholic Hospital* de Monrovia (Liberia), administrado por los Hermanos de la Orden de San Juan de Dios desde su apertura en 1963, forma parte integral del sistema sanitario de Liberia y es uno de los Hospitales de referencia de todo el país.

Tras tener que cerrar sus puertas en agosto de 2014 para su desinfección, el Hospital volvió a ofrecer sus servicios en noviembre de este mismo año y, desde entonces, ha atendido en torno a 12.150 mujeres por casos de embarazo y a alrededor de 4.142 niños menores de cinco años. En cifras generales, el centro ha asistido a cerca de 32.106 personas en diferentes áreas y por diversas razones médicas.

Actualmente, Liberia se encuentra libre de casos de Ébola. Sin embargo, durante el año 2015, últimos datos publicados por el *St. Joseph's Catholic Hospital*, los casos de malaria, anemia y problemas respiratorios figuran a día de hoy como las enfermedades con más prevalencia entre los pacientes que acuden diariamente al hospital.

A pesar de haber alcanzado cierta estabilidad, sigue siendo necesario incidir en la mejora de la atención socio-sanitaria, para alcanzar unos niveles de salud íntegros y equitativos.

Finalmente, cabe señalar que, con el fin de garantizar su sostenibilidad, el *Saint Joseph's Catholic Hospital* siempre ha priorizado el aumento del número de atenciones, ofreciendo un servicio de calidad no disponible en la zona y sin ningún tipo de discriminación, con el objetivo de mejorar la salud liberiana, ya que es un factor muy relevante para el desarrollo de una población.

- Reportes de la empresa constructora



 **Trinity Technical Services, Inc.**  
Congo Town Back Road  
Monrovia, Liberia  
Cell#: 0886-573804  
Email: [sacklands\\_9@yahoo.com](mailto:sacklands_9@yahoo.com) / [trinitytechnical2015@gmail.com](mailto:trinitytechnical2015@gmail.com)

Name/address
St. Joseph Catholic Hospital

## SUMMARY REPORT COVERING ONGOING RECORD ROOMS PROJECT



May 12, 2016



## **OUTLINES**

- 1.1 Project background
- 1.2 Work Plan
- 1.3 Site clearing
- 1.4 Foundation & Structure Slab
- 1.5 Pictorial view of Structures





## **1.1 PROJECT BACKGROUND**

The Project was diagrammed and estimated at budget cost of **Sixty Three Thousand Seven Hundred and Sixty-four Dollars and Eighty-three cents (\$63,764.84USD)**. After a long analysis, the said budget was cut down to an agreed amount of **Fifty Thousand United States (\$50,000.00)**.

The accepted amount was diagrammed into a payment plan. The said amount of **Twenty-One Thousand United States Dollars (\$21,000.00)** had been paid as advance payment for the implementation of the project up to Structure Slab.

The project officially started on March 6, 2016 after a long work of site clearing which compresses of removing of underground fuel tanks and transplanting of said tanks to different locations and the demolishing and clearing of existing structure which was occupying the site.



## 1.2 WORK PLAN

### ACCEPTED WORK DATA FOR THE PROPOSE BOOK STORE

#### FOUNDATION

Foundation cost - -	-	-	-	-	-	-	\$5,661.55USD
Duration - -	-	-	-	-	-	-	Three weeks
Labour - -	-	-	-	-	-	-	\$2,764.25USD
Transportation - -	-	-	-	-	-	-	\$552.00
Upfront payment -	-	-	-	-	-	-	<b>\$8,977.00USD</b>

#### DETAILS

##### WEEK ONE

###### Site Clearing

- a. Damaging of existing structure
- b. Profile and digging of foundation

##### WEEK TWO

- a. Foundation filling
- b. Lying of blocks
- c. Back filing and plumbing

##### WEEK THREE

- a. Foundation casting



## SUPERSTRUCTURE AND SLAB

Super Structure and Slab Cost - -	-	-	-	-	-	-	-	\$10,230.793USD
Duration - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	6 weeks
Labour - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	\$3,869.95USD
Transportation - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	\$552.00
<i>Upfront Payment</i> - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	<b>\$14,652.74USD</b>

### DETAILS

- a. Erection of pillows
- b. Slab frame work
- c. Steel and electrical work
- d. Plumbing
- e. Casting

<b>Structure First Flood Cost</b> - -	-	-	-	-	-	-	-	\$11,318.00USD
Duration - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	2 weeks
Labour - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	\$1,658.55USD
Transportation - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	\$552.00
Upfront Payment - - - - -	-	-	-	-	-	-	-	<b>\$13,528.55USD</b>

### DETAILS

- a. Lying of Blocks
- b. Cutting of partition
- c. Linton casting
- d. Pillow casting
- e. Tile been



**ROOFING WORK**

Cost -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$11,389.00
Duration -	-	-	-	-	-	-	-	-	2 weeks
Labour -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1,105.00USD
Transportation -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$552.00
Upfront Payment -	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>\$13,046.00USD</b>

**DETAILS**

- a. Wood work
- b. Zincing

**BOOK STORE FINISHING COST**

Cost -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$11,350.00USD
Duration -	-	-	-	-	-	-	-	-	2 months
Labour -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$1,658.55USD
Transportation -	-	-	-	-	-	-	-	-	\$552.00
Up Front Payment -	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>\$13,560.55USD</b>

**GRAND TOTAL**===== **\$63,764.84USD**

*Note: At every stage, you will receive a completion report.*

**NEGOTIATED AMOUNT** ..... **\$50,000.00USD**



### 1.3 SITE CLEARING



The site clearing started on the 20<sup>th</sup> of February 2016. Starting with the removal of fuel tanks underground which extended under the existing restaurant structure. This issue was carefully handled and removed than transferred to a location which is now used as a diesel filling station. After that, the existing structure which was used as a warehouse was demolished and cleared for foundation profile setup.





#### 1.4 FOUNDATION AND SUPER STRUCTURE SLAB

Based on the Geology of the site, a 16 pillow at 7ft depth was erected with the support of the 4ft square mat and the pillow of 8"x12".

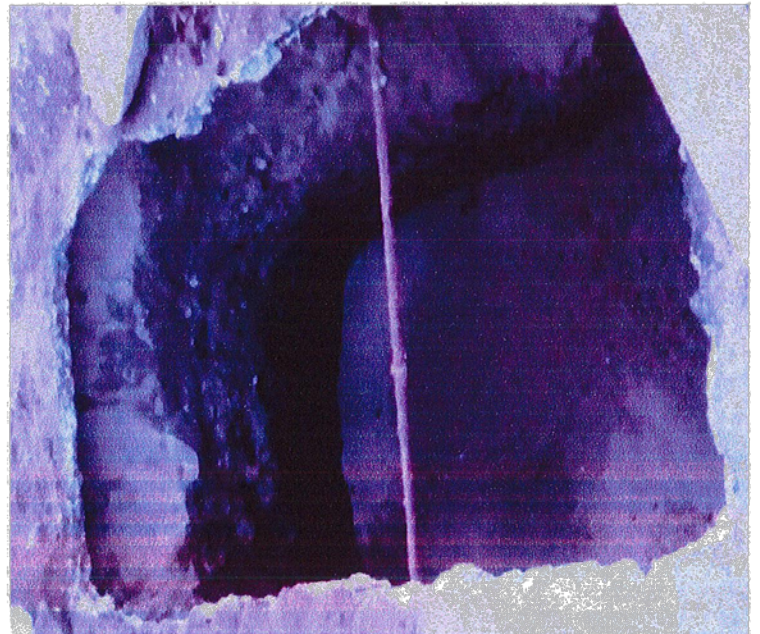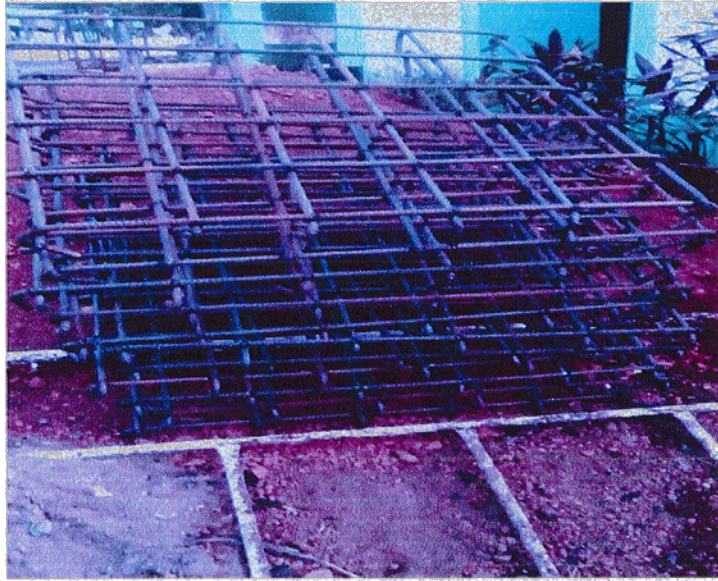




## 1.6 PICTORIAL VIEW OF STRUCTURES





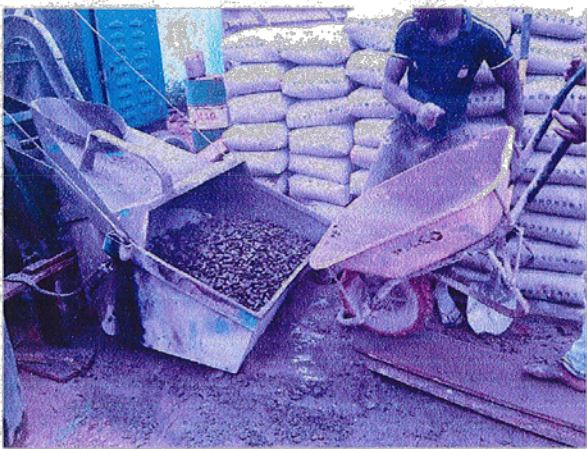







 **Trinity Technical Services, Inc.**  
Congo Town Back Road  
Monrovia, Liberia  
Cell#: 0886-573804  
Email: [sacklands\\_9@yahoo.com](mailto:sacklands_9@yahoo.com) / [trinitytechnical2015@gmail.com](mailto:trinitytechnical2015@gmail.com)

## **SUMMARY REPORT**

PROJECT: ST. JOSEPH CATHOLIC HOSPITAL, RECORD ROOMS &  
CONFERENCE HALL

LOCATION: ST. JOSEPH CATHOLIC COMPOUND, CONGO TOWN

DATE: OCTOBER 30, 2016



**TRINITY INVOLVEMENT PROJECT VIEW**



October 31, 2016

This report covers the progress made on the Record room and the final maturity date.

The record structure work has been completed in conclusion with the roofing, plastering, and electrical wiring, plumbing and ceiling work. Currently, we are proceeding with tiling, instillation of windows and ending of doors instillations.

From the look of things we apologize that the building will be turned over by November 30, 2016 due to the fact that the tiling will require a week for proper compartment after instillation is completed and also a constraint from the factory which has caused delay in supplying the windows materials.

Attached are pictorial views of the progress made so far on the project.

Respectfully submitted.

Roland S.K. Broh  
Chief Executive Officer (C.E.O)



**DOOR AND TILING**



**DOORS INSTALLATION**



**WINDOWS INSTALLATION**





**TILES INSTILLATION**



**TILES INSTILLATION**



**TILES INSTILLATION**



**FRONT VIEW**



**SIDE & FRONT VIEWS**

## **INFORME ECONÓMICO:**

- Ingreso del primer 40% de la subvención
- Ingreso del segundo 60% de la subvención
- Transferencia del primer 40% de la subvención al SJCH
- Transferencia del segundo 60% de la subvención al SJCH
- Recepción del primer 40% de la subvención en el SJCH
- Recepción del segundo 60% de la subvención en el SJCH
- Facturas justificativas del proyecto

- Ingreso del primer 40% de la subvención



Nombre del ordenante	<b>ASOCIACION AFRICANISTA MANUEL IRADIER</b>
Concepto para el ordenante	<b>1º pago Zer0,7% Liberia</b>
Cuenta origen	<b>2095 3113 71 1090191726</b>

Cuenta destino (IBAN)	<b>ES 14 0075 0001 86 0607094746</b>
Código banco	<b>POPUESMMXXX</b>
Nombre del beneficiario	<b>Fundación Signos Solidari</b>
DNI/NIF	
Domicilio	
Población	
Código postal	
Concepto para el beneficiario	<b>1º pago Zer0,7% Liberia</b>


Ha solicitado el envío del justificante de la operación.

Importe	<b>19.880,00 €</b>
Comisión	<b>29,82 €</b>

Banco Popular Español, S.A. Dominio Social: Valdeazules, S.A. escritura Goya 55. MADRID. (V0110101)  
 Reg. Merc. de Madrid: L. 174. F. 44. C. 5455. Ins. 1. NIF: A28000722

FECHA <b>19-01-2016</b>	CL. SUCURSAL <b>0001</b>	SUCURSAL <b>MADRID, OP</b>	Fecha de origen: <b>18-01-2016</b>
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------------

**Ordenante:** ASOCIACION AFRICANISTA HANUEL IRADIE  
**Beneficiario:** Fundaci n Signos Solidari  
**Cuenta:** 0075 0001 86 0607094746  
**Concepto:** ESPAÑA  
 1 pago Zer0,7 Liberia  
**Recibida de:** 2095-3113 KUTXABANK, S.A  
 SIERVAS DE JESUS, 27  
 01001 VITORIA-GASTEIZ  
**Por cuenta de:**  
 Opción de precios: Compartido

DESTINATARIO 	<b>FUNDACION SIGNOS SOLIDARIOS</b> <b>FERRAZ NUM 83</b> <b>28008 MADRID</b>
	<b>0001</b>

Nominal.....	19.880,00 EUR
Comisión.....	
Correo.....	
<b>Total.....</b>	<b>19.880,00 EUR</b>

VALORACION <b>19-01-2016</b>	TOTAL ABONO <b>19.880,00 EUR</b>
---------------------------------	-------------------------------------

ASENTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO

Código Cuenta Cliente (C.C.C.)				Cl. Concepto
Entidad	Oficina	D.C.	Num. de Cuenta	
0075	0001	86	0607094746	16



- Ingreso del segundo 60% de la subvención

Nombre del ordenante **ASOCIACION AFRICANISTA MANUEL IRADIER**

Cuenta destino (IBAN) **ES 14 0075 0001 86 0607094746**

Código banco **POPUESMMXXX**

Nombre del beneficiario **Fundación Signos Solidari**

DNI/NIF

Domicilio

Población


Código postal

Concepto para el beneficiario **60% subv PRO LIBERIA**

Importe **28.500,00 €**

# Popular

ABONO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA

FECHA: 29-06-2016	CL. SECURSAL 0001	SECURSAL MADRID, OP	Fecha de origen: 28-06-2016
Ordenante: ASOCIACION AFRICANISTA MANUEL TRADIE		Beneficiario: Fundaci n Signos Solidar	
Concepto: ESPAÑA 69 subv PRO LIBERIA		Cuenta: 0075 0001 86 0607094746	
Recibida de: 2095-3113 RUTXABANK, S.A SIERVAS DE JESUS, 27 01001 VITORIA-GASTEIZ		Por cuenta de: Opción de precios: Compartido	
DESTINATARIO  FUNDACION SIGNOS SOLIDARIOS FERRAZ NUM 83 28008 MADRID 0001		Nominal	28.500,00 EUR
		Comision Correas Total	28.500,00 EUR
ASENTAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO		VALORACION 29-06-2016	TOTAL ABONO 28.500,00 EUR
		Edigo: Cuenta: Cliente: (C.C.C.)	
		Oficinas	Oficina: D.G. Num de Cuenta
		0075	0001 86 060 7094746 16

Sede Popular: Barrio de A. Donato, 36, 28001 Madrid, España. Teléfono: 91 540 00 00. Fax: 91 540 00 01. www.popular.es



- Transferencia del primer 40% de la subvención al SJCH

# Popular

**ADEUDO POR LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO EMITIDA**

009/012 004200

2C0442771 DIDIÓPEZ

160127

6051

0001-09 MADRID, OP

27-01-2016

OPERACION  
043229776

RF. CLIENTE

FECHA ORIGEN Y NUMERO O REF. CEDENTE <b>FECHA ACEPTACION: 27-01-2016</b>		REFERENCIA	MONEDA <b>EUR-EUROS</b>	IMPORTE: <b>19.880,00</b>
ORDENANTE <b>FUNDACION SIGNOS SOLIDARIOS FERRAZ NUM 83 MADRID MADRID 28008 MADRID</b>		BENEFICIARIO <b>ST JOSEPH CATHOLIC HOSPITAL CONGO TOWN MONROVIA N. CUENTA: 02-2010-004510-05</b>		
<b>B. DEL BENEF.: INTERNATIONAL BANK (LIBERIA) LIMITE IBLRRLMHXX MONROVIA</b>		CONCEPTO <b>40: 1ER PAGO SUBVENCION ZERO,7</b>		<b>GASTOS SHA COMPARTIDOS</b>
Datos de la Remesa/Credito (Cuando proceda)		LIQUIDACION PRACTICADA EN:		CONTRAVALOR:
MONEDA	IMPORTE NOMINAL	<b>EUR-EUROS</b>		<b>19.880,00</b>
CAMBIO:		DETALLE DE LA LIQUIDACION: (1)		GASTOS:
Contravalor Nominal Remesa/Credito				
<b>B. ENCARGADO: DEUTSCHE BANK A.G., TAUNUSANLAGE, 12 FRANKFURT-MAIN</b>		IBAN: <b>ES14 0075 0001 8606 0709 4746</b>	VALORACION <b>27-01-2016</b>	LIQUIDO ASENTADO EN CUENTA <b>19.880,00</b>

Banco Popular Español, S.A. domicilio social: Velázquez, 54 esquina 55ª y 56ª, MADRID  
Reg. Merc. de Madrid: 1.174. F. 44. N. 5456. Ins. NIF: A28000277. N.º 2001

DATOS DEL ORDEN / TRANSFERENCIA



(1) Las comisiones se calcularán sobre el "CONTRAVALOR", excepto las señaladas con (\*) que lo serán sobre el "CONTRAVALOR NOMINAL REMESA/CREDITO".

- Transferencia del segundo 60% de la subvención al SJCH





- Recepción del primer 40% de la subvención en el SJCH

# Statement of Account

INTERNATIONAL BANK (LIBERIA) LIMITED

USD - BROAD STREET  
64 BROAD STREET  
P.O.BOX 10-0292  
MONROVIA

For Customer Service,  
Call us at +2315421133  
or Fax us at +13094074245  
Bank Sort Code: 004

02.2010-004510-0 (004510-05)  
ST. JOSEPH CATHOLIC HOSPITAL  
US DOLLARS  
USD - BUSINESS CHECKING (CURRENT)

ST. JOSEPH CATHOLIC HOSPITAL  
  
MONROVIA, LIBERIA

THIS STATEMENT COVERS 28 Jan 2016 THROUGH 28 Jan 2016

Page 1 of 1

Trx Date	TxRef	Details	Chq No	Value Date	Debits	Credits	Balance	Payee
<u>Jan, 2016</u>								
28	00	000000				28,261.21	28,261.21	
28	04	546152	CHECK WITHDRAWAL	000252	-8,000.00		20,261.21	
28	04	546156	CHECK WITHDRAWAL	000251	-2,500.00		17,761.21	
28	04	546475	PMT OF IT#CB-00087			21,117.45	38,878.66	
28	04	546495	FEES ON IT#CB-00087		-211.17		38,667.49	
<b>Closing Balance:</b>							<b>38,667.49</b>	

THANK YOU FOR BANKING WITH US

## NEWSLINE

In order to improve efficiency and service delivery, effective June 1, 2010, we will no longer be returning your cleared checks. All cleared checks will be retained by IB. Photocopies of cleared checks will be provided to customers on demand. Please contact the Customer Service Department for any additional questions. Trust & Reliability.

Balance Type	Balance
Book Balance	61,503.42
Cleared Balance	61,503.42
Account Minimum	-250.00
Available:	61,253.42

Printed By: hyoung  
Bank Manager 6

- Recepción del segundo 60% de la subvención en el SJCH



Welcome : ST. JOSEPH CATHOLIC HOSPITAL | Corporate Banking  
 | Logout | Change Password | Last Login : 9/6/2016 9:26:11 AM

Internet Banking

- Account
- Request
- Request Status
- Enquiry
- Trade Finance

Ledger

Amortization Chart

FD/RD Recknor

Access Logs

Account Statement

Account Details

Account Number	Account Type	Branch Name	Balance
00121970053180502	CURRENT DEPOSIT	BROAD STREET	72224.89

Account Number: 00121970053180502 - USD - BUSINESS CHECKING (CURRENT)

Short Ledger

Account Title: USD - BUSINESS CHECKING (CURRENT)  
 Name: ST. JOSEPH CATHOLIC HOSPITAL  
 Account Open Date: 25-Sep-2014 Ledger Number:  
 From Date: 01-Jul-2016 To Date: 31-Jul-2016  
 Format for Statement:

Tr Date	Narration	Credit	Debit	Closing Balance	Cheque No	Cheque Date
01-Jul-2016	Opening Balance			59919.89 Cr		
02-Jul-2016	PMT IFO EDWIN M. MULBAH		2500.00	57419.89 Cr	292	02-Jul-2016
11-Jul-2016	ck from clearing ISSUED 2 TOTAL LIB		11240.00	46179.89 Cr	293	07-Jul-2016
22-Jul-2016	PMT OF IT#BB-00049	30022.90		76202.79 Cr	0	
22-Jul-2016	FEES ON IT#BB-00449		300.23	75902.56 Cr	0	
22-Jul-2016	PMT OF IT# MB-005807	9746.90		85649.46 Cr	0	
22-Jul-2016	FEES ON IT# MB-005807		97.47	85551.99 Cr	0	
30-Jul-2016	Ledger fees deducted (Jul-2016)		30.00	85521.99 Cr		
30-Jul-2016	Cheque withdrawal charges (Jul-2016)		0.50	85521.49 Cr		
30-Jul-2016	Internet Banking Charges (Jul-2016)		5.00	85516.49 Cr		

- Facturas justificativas del proyecto



# TRINITY TECHNICAL SERVICES, INC

Congo Town Back Road

Monrovia, Liberia

Cell #: 0886-573-804

Email: sacklands\_9@yahoo.com

No.: 090



## CASH RECEIPT

Date: 3/20/2016


Clients: St. Joseph Catholic Hospital

The Sum of: twenty One thousand United States Dollar

Purpose: Record Project up to Structure Slab.

Amount Paid \$: 21,000.00 USD

Balance Due \$: 29,000.00 USD



Authorized Signature

**Trinity Technical Services, Inc.**  
 Congo Town Back Road  
 Monrovia, Liberia  
 Cell#: 0886-573804  
 Email:trinitytechnical2015@gmail.com

**Cash**

Date	Payment
22/07/2016	608

Name/address
St. Joseph Catholic Hospital

Description	Qty	Rate	Total
Thirty thousand & twenty two dollars - ninety cent	1	30,022.90	30,022.90
Please remit to above address.			
<b>Total Amount</b>			<b>30,022.90 USD</b>

**Payment for record room project**



**ANEXOS:**

- Fotografías del proceso de construcción
















**PROYECTOS POST-ÉBOLA**  
**FINALIZACIÓN EJECUCIÓN PROYECTO “RECORDS ROOM”, EN EL SAINT JOSEPH ´S CATHOLIC HOSPITAL DE MONROVIA**

**F. SIGNOS SOLIDARIOS-A. AFRICASNITAMANUEL IRADIER**

**Saint Joseph's Catholic Hospital**  
P.O. Box 512  
Congo Town Monrovia, Liberia  
Tel: +231888248772



**St. Joseph's Catholic Hospital Record and Training Unit 2017**

OLD	NEW
	
	
	

**M&D PRINTERS ENTERPRISE**  
7A Delco Road Lunsar, Sierra Leone  
Tel: +232 88 560824 / +232 79 646513  
Email: deenkay@yahoo.com

Hace ya varias semanas que recibimos, desde el hospital San José de Monrovia, la noticia y las imágenes del fin de la ejecución del proyecto realizado a lo largo del 2016, y financiado con el dinero enviado por la Fundación Signos Solidarios, concedido por el Fondo Zer0,7% al convenio de colaboración entre la FSS y la Asociación africanista Manuel Iradier, consistente en la construcción de una nueva sala de archivos y multiusos, que facilitará y agilizará el trabajo en el hospital de la capital liberiana, todavía en proceso de alcanzar su máximo rendimiento, tras la reapertura de sus puerta después de la epidemia de Ébola.

Al igual que en 2014, y como ya anunciamos en nuestra web, la colaboración de esta ONG vitoriana con nuestra Fundación resultó decisiva para la concesión de los cerca de 50.000 euros del Fondo de solidaridad Zer0,7%, de los trabajadores del Gobierno Vasco y Osakidetza, para la realización de este importante proyecto para el sistema de salud liberiana.



Un ejemplo más de la importancia de la colaboración entre entidades de desarrollo, y de la implicación de la Fundación con las víctimas de la epidemia de ébola, mucho tiempo después del fin del foco mediático sobre el problema, cuyas secuelas aún persisten en los países afectados.



Así, como ya anunciamos, el proyecto *“Apoyo a la reapertura de los servicios en el Saint Joseph’s Catholic Hospital de Monrovia tras la epidemia de ébola”*, presentado en 2015 y ejecutado en 2016, ya es una realidad.

Os dejamos el completo informe final enviado al financiador, para todo aquel que quiera saber más sobre el mismo, y cumpliendo así con nuestro compromiso de transparencia.

Gracias a todos los que lo han hecho posible.



**f**: Fundación Signos Solidarios  
<http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php>  
[fundacionsignossolidarios@gmail.com](mailto:fundacionsignossolidarios@gmail.com)  
810521157 / 61677716
